

PHASES DE TRAVAUX



La réalisation des travaux se déroulera en plusieurs phases, selon le planning suivant* :

SUR L'ENSEMBLE DE LA ZONE :

• MI-MARS À FIN AVRIL 2016

Installations de chantier.

• MAI 2016

Travaux de murettes guides.

• MAI À SEPTEMBRE 2016

Parois moulées.

• JUIN 2016 À JANVIER 2017

Travaux de traitement du sous-sol par des injections de coulis de ciment.

REALISATION DE LA TRANCHEE COUVERTE DE LA TRÉMIE :

• JUILLET / AOÛT 2016

Dalle de la tranchée couverte.

• AOÛT 2016

Début du terrassement.

PUITS DE SORTIE DU TUNNELIER :

• OCTOBRE / NOVEMBRE 2016

Terrassement.

• DÉCEMBRE 2016

À MI-FÉVRIER 2017

Réalisation du radier (plancher de la station).

• MI-FÉVRIER 2017

Arrivée du tunnelier.

• MI-FÉVRIER À MI-AVRIL 2017

Démontage du tunnelier.



Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée par ces interventions et vous remercions de votre compréhension.

CIRCULATION ET CHEMINEMENT PIÉTONS

- Pas de modification de circulation dans le secteur.
- Réorganisation du stationnement et des aires de livraisons le long des trottoirs nord et sud.
- Maintien du cheminement piétons le long des façades avec l'aménagement d'une traversée de la zone de chantier au niveau de l'esplanade Chéret.

*sauf intempéries et aléas de chantier

INFO TRAVAUX

NOUVEAU TRAM
OUEST-EST
GAGNANTS SUR TOUTE
LA LIGNE !

RÉALISATION DES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL PUITS DE SORTIE DU TUNNELIER ET TRÉMIE DU TUNNEL RUE DE FRANCE



Les travaux de déviations de réseaux sont en cours d'achèvement au niveau de la rue de France.

À partir de la 2^{ème} quinzaine du mois de mars 2016, démarre une nouvelle phase de travaux. Il s'agit des travaux de génie civil pour le puits de sortie du tunnelier et de la trémie du tunnel.

TOUTES LES INFORMATIONS SUR LE PROJET

- En ligne sur tramway.nice.fr
- Au POINT INFOTRAM situé Place Chéret (rue de France).
- Mardi et jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

POSEZ VOS QUESTIONS

- Par mail : tramway.contact@nicedazur.org
- Par téléphone : **0800 0800 06**


Conception : ops2.com - Ne pas jeter sur la voie publique.




MÉTROPOLE
NICE CÔTE D'AZUR

PLAN DES INSTALLATIONS DE CHANTIER D'OUEST EN EST

Rue de France - du n° 162 au n°136

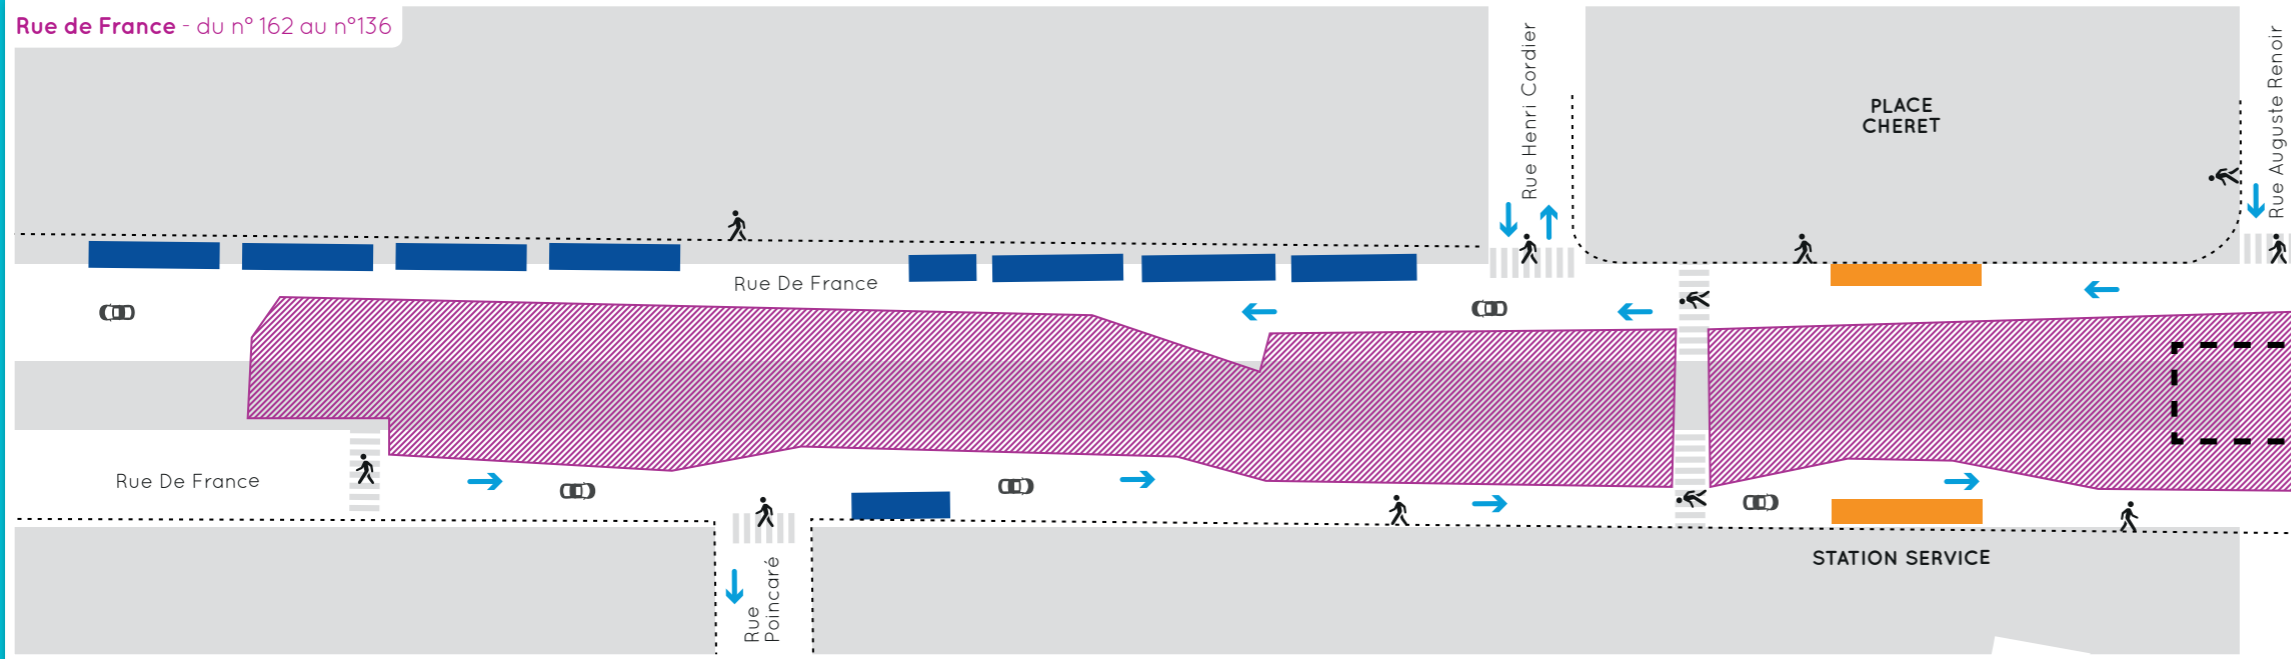

suite de la rue de France - du n° 136 au n° 102

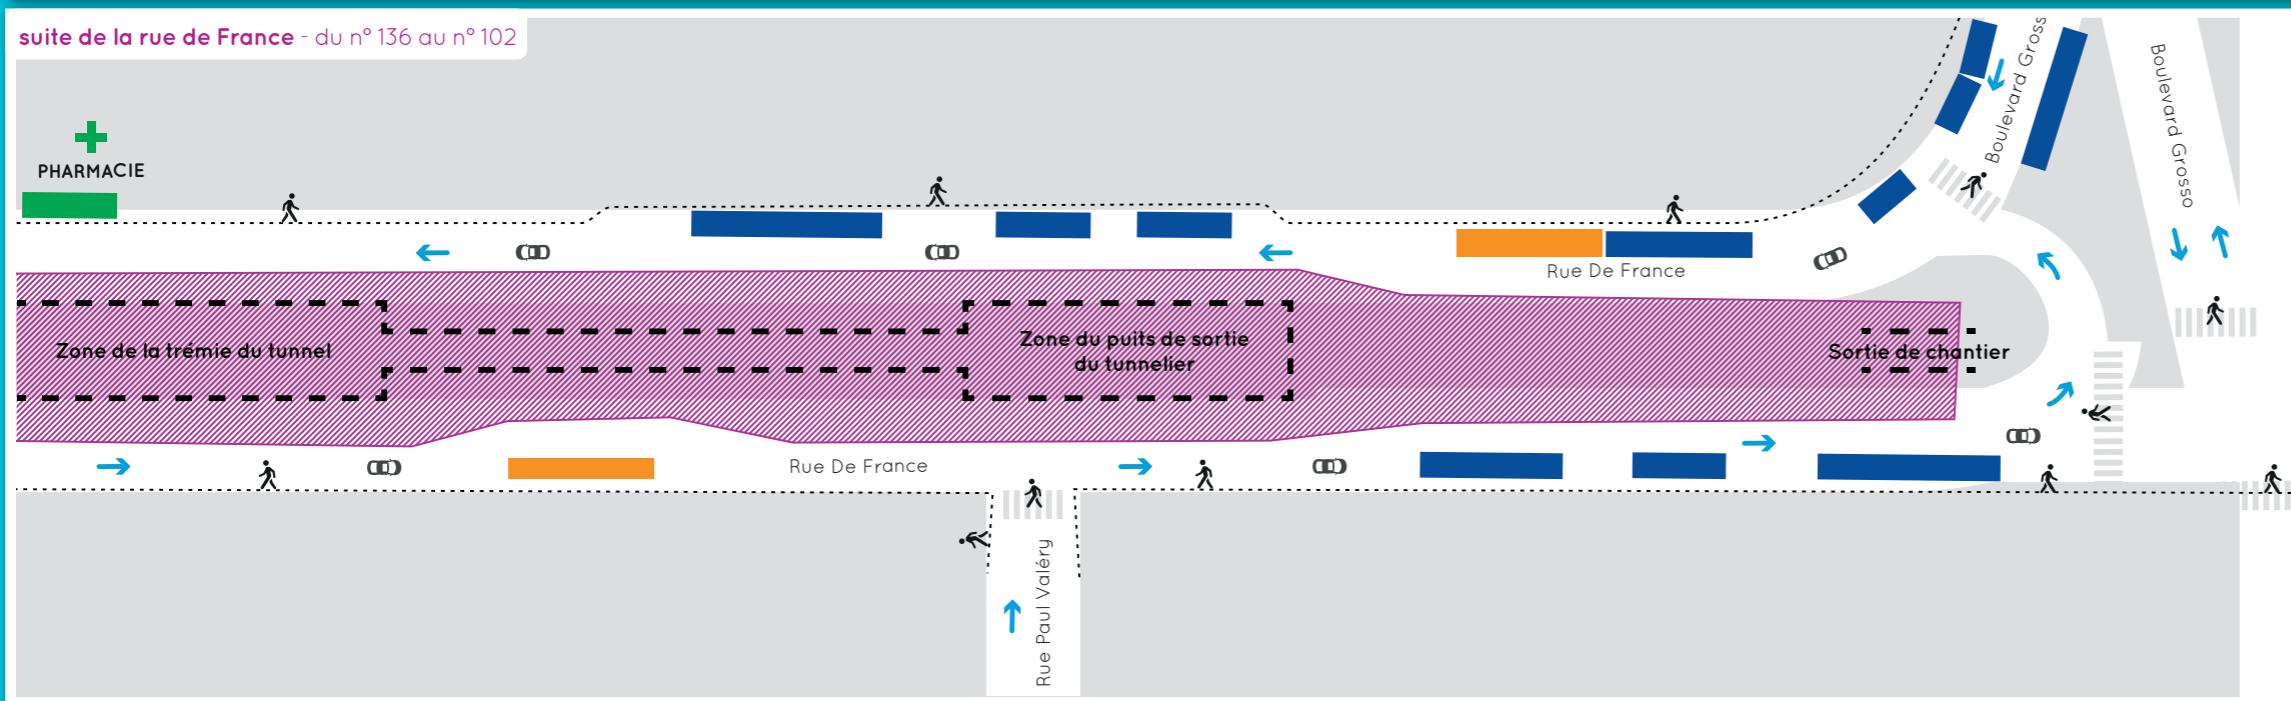


INSTALLATION DU CHANTIER

Les travaux préparatoires de l'installation du chantier de génie civil se dérouleront de la façon suivante :

Poursuite des déviations de réseaux, enlèvement du quai de bus et démontage de l'îlot central, avec suppression du stationnement en épi.

- ▶ Depuis le 14 mars et jusqu'au 25 mars : entre les rues Cordier et Renoir.
- ▶ À partir du 23 mars et jusqu'au 4 avril : entre les rues Henriot et Poincaré.
- ▶ À partir du 4 avril et jusqu'au 18 avril : entre les rues Valéry et le bd Grosso.
- ▶ À partir du 4 avril et jusqu'au 13 avril : entre les rues Poincaré et Cordier.

LÉGENDE

-  Emprise du chantier
-  Cheminement piétons
-  Aires de stationnements
-  Aires de livraisons
-  Arrêt minute
-  Circulation automobile
